

概念性城市设计总平

众智园
最小数据安全实验站

AI 原点
知识交换与公共监督

大钟寺
普惠公共服务

证明里程

BELT / ROUTE / SECTION / CONTRACT

11.4 km²

总体带

组织

3

日常路线

可达

60 × 14 m

同意剖面

选择

G0—G4

实施合同

放行

当前放行

DM-P01
HOLD

无现场证据，不得自主放行。

待核验 正式边界 / 容积率 / 高度 / 道路红线

铁路不是造型，而是一种公共能力



1909及以前 | 京张铁路工程影像



2016 | 清华园站停运前站台



2024 | 修缮后的清华园老站

1909

工程自主

中国自主设计、建造京张铁路

1980s

创新自主


中关村让知识进入市场与社会

2030

智能自主

人能够理解、授权、中止和审查AI

城市应该永久保存共同历史，但不应永久保存每个人的日常轨迹。

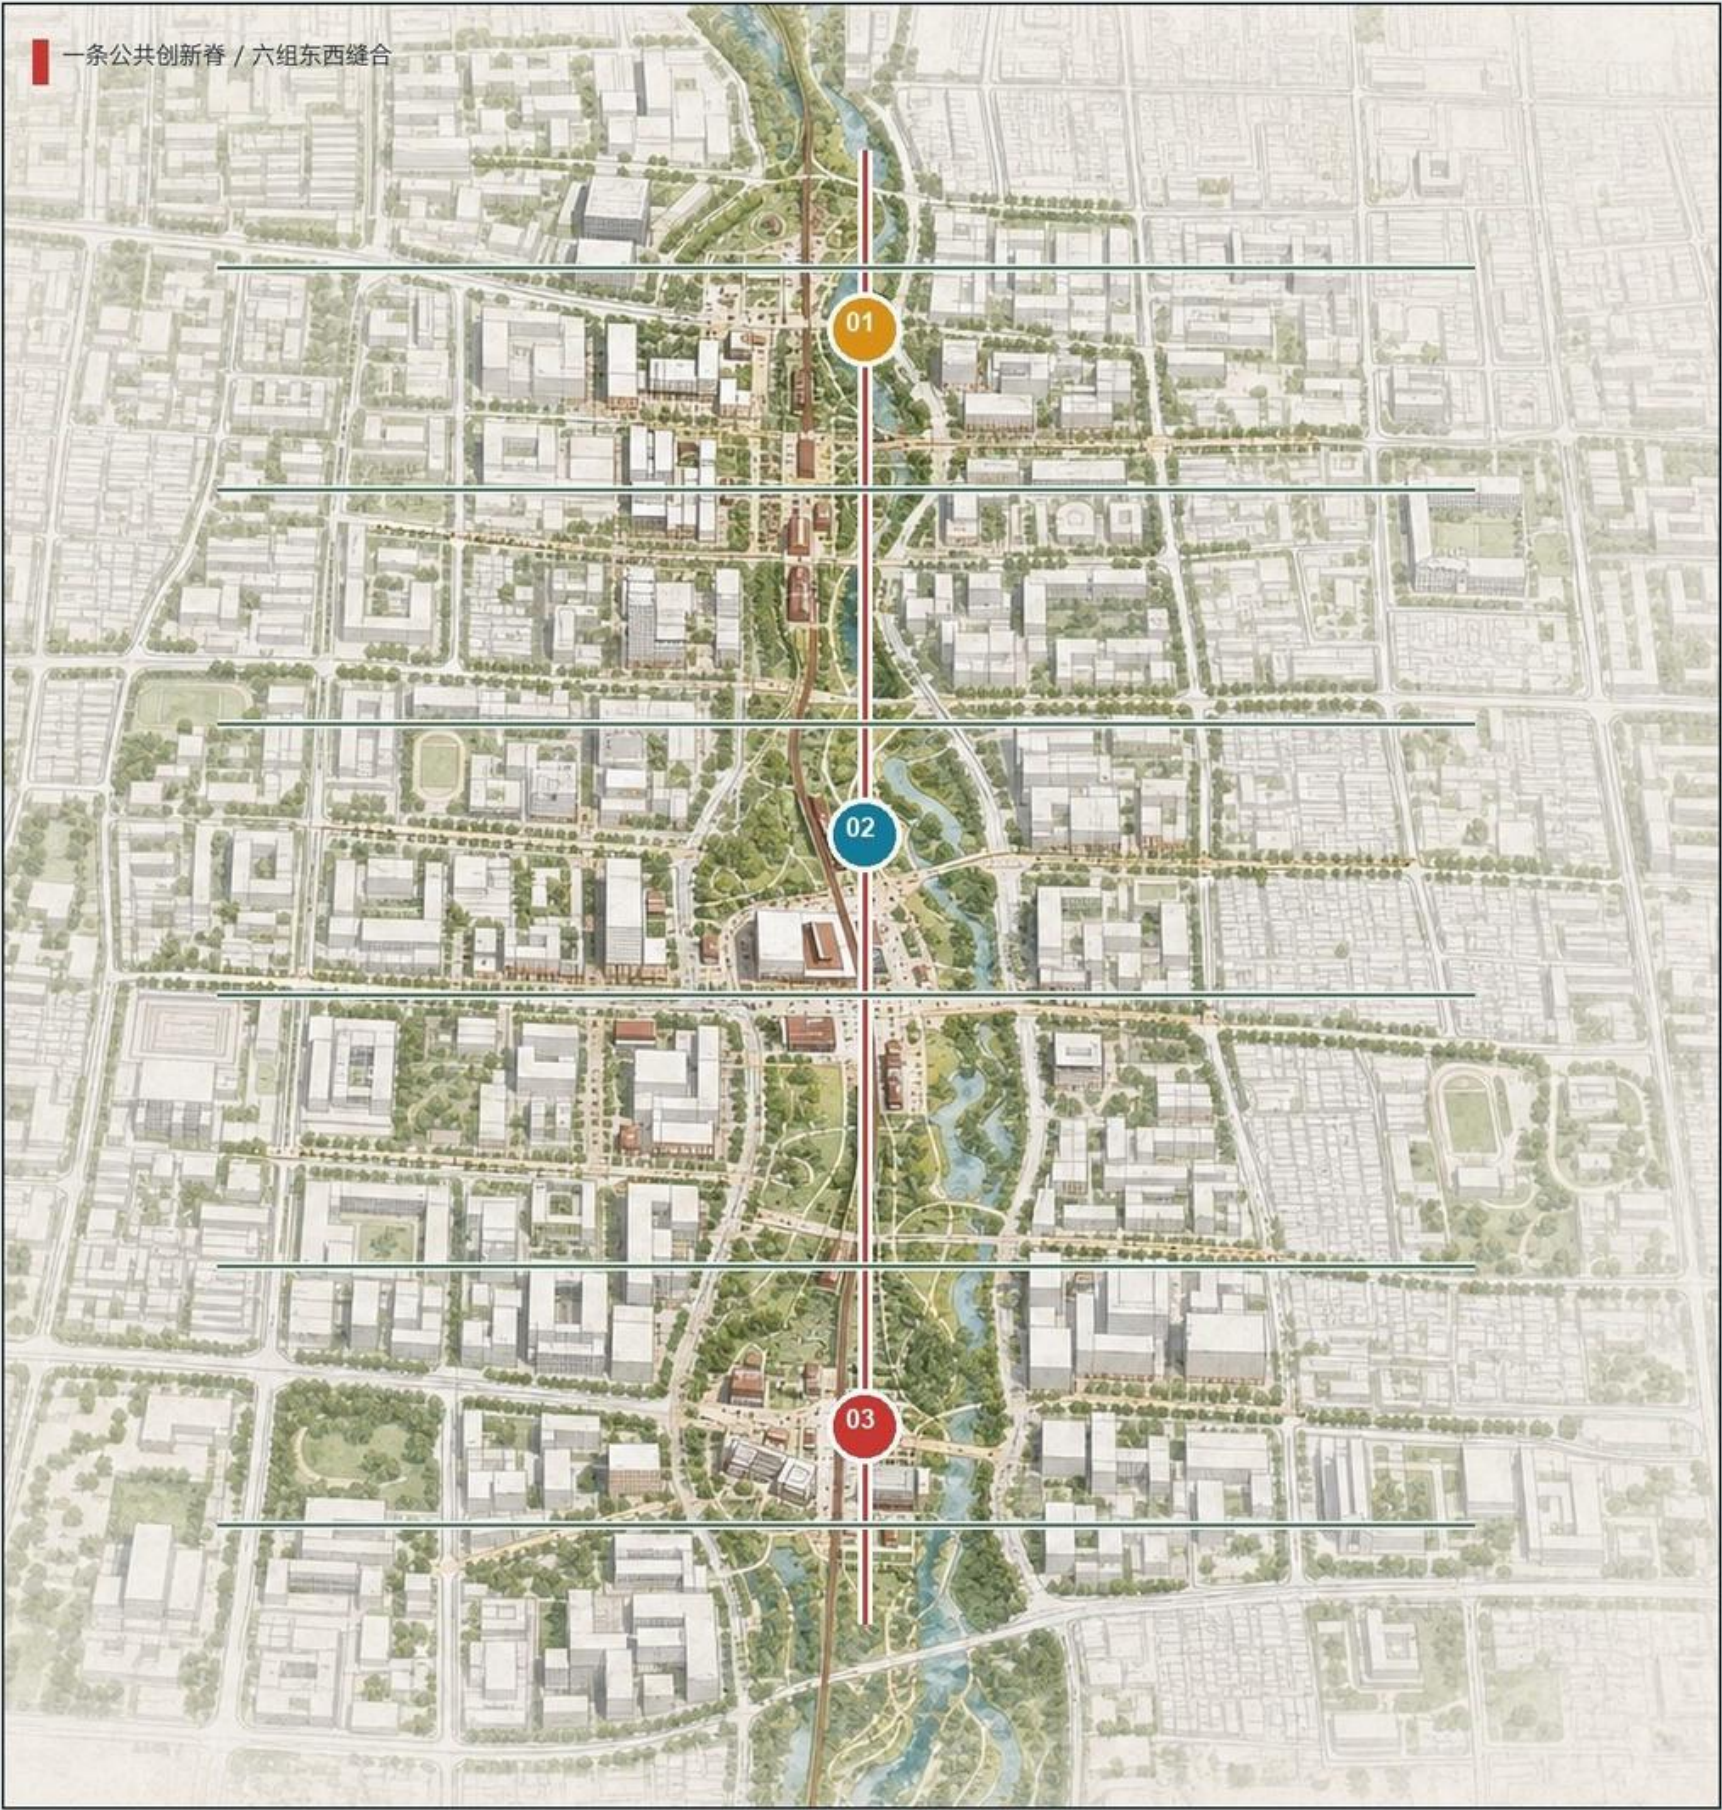

空间控制账本

临时总体范围

11.413 km²

概念绿地比例

12.34%

概念公共空间

7.33%

正式边界

UNKNOWN

地块 / 道路红线

UNKNOWN

容积率 / 高度

UNKNOWN

普通等价格路线

TARGET

公共 AI 放行

HOLD

设计次序

01 先修缮

02 再开放

03 可逆植入

04 最后新建

图面清晰不等于边界精确；精度必须由测绘与法定资料取得。

DM-R01 众智园

上班 / 午间 / 换乘



DM-R02 AI 原点

居住 / 学习 / 服务



DM-R03 大钟寺

地铁 / 服务 / 交流



一条路线，五个空间义务



放行测试

100%

普通路线可达

≥80%

边界理解

100%

人工接管

0

未解决重大问题

现场状态

NOT FIELD-TESTED / HOLD

以上为放行验收门槛，不是已经取得的现场成绩。



公共界面控制表

普通空间	AI 门槛	本地停止	建筑次序
无需账号即可使用	用途 / 数据 / 留存可见	物理断开 + 人工接管	修缮 → 开放 → 植入 → 新建

进入详细设计前必须查明 权属 · 遗产等级 · 结构承载 · 消防 · 容积率 · 高度 · 道路红线



DM—P01 / HOLD

智治园试点护照

空间 60 × 14 米试点包络

责任 街道 / 社区 / 运营方

允许 计数 + 安全事件

禁止 人脸识别 + 静默追踪

遗忘 事件数据不超过 30 天

等价 有人值守普通路线

停止 红色按钮 + 本地断电

放行 每类画像每试点 5 人

无 AI / 4.0 米

普通慢行

· 最小净宽 1.8 米

匿名辅助 / 2.5 米

主动选择传感

· 最小净宽 1.8 米

测试场 / 5.0 米

围合 + 值守

· 最小净宽 1.8 米

缓冲 / 2.5 米

绕行始终开放

· 最小净宽 1.8 米

公共放行测试

01

普通路线可达率 100%

02

边界理解率 ≥80%

03

人工接管成功率 100%

04

未解决重大问题 = 0

WP4 · 121—180



保持 / 放行 / 修改 / 退役

成本护栏

¥ 750—1350 万

概念级试点总投资带



RACI + 暂停点

区级部门	最终负责	权属 + 许可
社区	执行负责	路线 + 投诉
运营方	执行负责	人员 + 停止演练
公众评审	受咨询	放行证据

DEFAULT = HOLD UNTIL EVIDENCE IS PUBLISHED

DM-P01

同意剖面

¥120—220万

暫停

路线测试与撤回演练通过后才放行

DM-P02

来源门诊

¥80—150万

暫停

路线测试与撤回演练通过后才放行

DM-P03

免账号会客厅


¥150—280万

暫停

路线测试与撤回演练通过后才放行

前置依赖 正式边界 · 权属调查 · 消防/交通许可 · 基线计数 · 无障碍复核

把总体设计变成可逐时核验的公共服务：普通服务先行，AI 可见、可选、可停止。

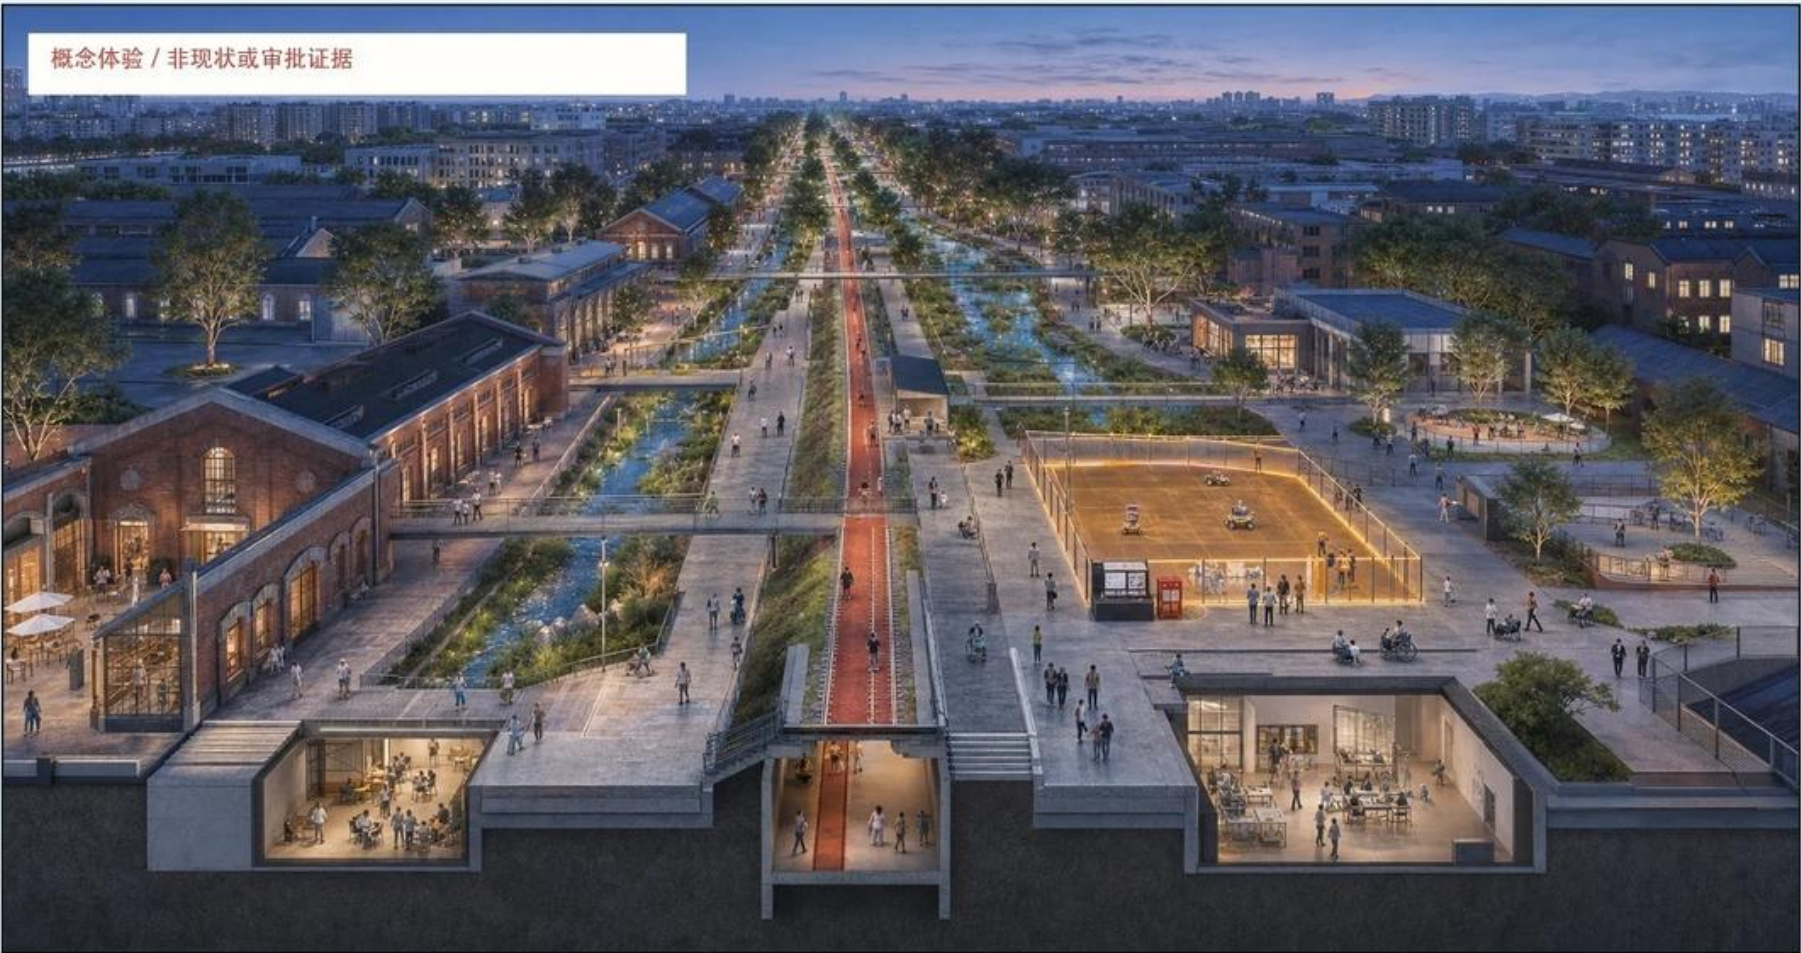

一条线，五个时段

SPACE × SERVICE × ACCOUNTABILITY

- 06:00 清晨通勤 + 养护
- 09:00 知识交换 + 企业服务
- 12:00 社区共餐 + 午间公园
- 18:00 公开试验 + 失败复盘
- 22:00 夜间归途 + 系统归零

默认：HOLD，直到现场基线、许可和无障碍复核完成

逐时运营矩阵

时段	普通服务	可选 AI	责任主体	放行条件	证据状态
06:00	无账号通勤、保洁、无障碍路线	端侧拥挤提示；默认关闭识别	街道 + 养护方	普通路线连续可达	待现场计数
09:00	法律、安全、开源咨询台	匿名知识匹配	园区 + 公益伙伴	人工窗口同步开放	服务原型
12:00	共餐、遮荫座椅、儿童活动	端侧多语导览	社区 + 公园运营方	无需注册且纸质等价	路线待测
18:00	公开旁听、申诉与复盘	围合试验；物理停止	运营方 + 公众评审	停止演练及删除回执	HOLD
22:00	照明归途、人工值守	系统归零及异常审计	街道 + 独立审计	数据自动过期	待离线审计

总体愿景 / AI 概念体验 / 非现状证据



先做一个样段，再讨论扩展

每个重点区先完成一个普通服务可独立运行、AI 可拆除、责任可签认、结果可公开的双记样段，再讨论扩展

概念总投资带

¥750—1350 万

三样段 ¥350—650 万 + 共用基线/许可/运营/复原 ¥400—700 万

普通路线 100%

人工接管 100%

边界理解 >80%

重大问题 = 0

DM-PB01

¥120万—¥220万

停机花园

普通	匿名	试验	缓冲

普通服务 无 AI 通行 + 遮荫休息

可选 AI 围合低速测试 + 急停

责任签认 试点运营负责人

失败回退 48 小时拆除数字构件

DEFAULT = HOLD / 未现场测试

DM-PB02

¥80万—¥150万

来源门诊

普通	匿名	试验	缓冲

普通服务 人工/纸面信息 + 申诉

可选 AI 可撤回来源登记

责任签认 人工服务负责人

失败回退 关闭 AI，人工服务继续

DEFAULT = HOLD / 未现场测试

DM-PB03

¥150万—¥280万

免账号会客厅

普通	匿名	试验	缓冲

普通服务 无障碍到达 + 多语人工

可选 AI 端侧多语辅助

责任签认 多语服务负责人

失败回退 关闭 AI，多语会客厅继续

DEFAULT = HOLD / 未现场测试

五道放行闸门



G0 锁定事实



G1 普通服务先开



G2 可逆原型



G3 ≤ 20 个值守窗口



G4 保留/修改/退役

公开记录约束设计，现场证据决定放行；没有证据的位置保持空白。

官方记录 6	地块权利记录 1	合格现场观察 0 / HOLD	桌面检查 8 / 8 PASS
-----------	-------------	--------------------	--------------------

清河 / 众智园 京张高铁东侧，小营西路—西二旗北路 已核官方记录 134,619.3 m² 公共工程合同面积 ¥28,986,162.09 合同价：折算 ¥215.32/ m² 计划 2026-05-29 合同计划竣工日，不代表实际竣工 现场任务 / PENDING FIELD ROUTE FS-01 · ≥12 点 × 早/中/晚 3 时窗 禁止推定 建设单位不等于土地权利人；合同段不等于众智园官方边界。	AI 原点 五道口—清华东路西口公共生活界面 已核官方记录 总体谋划已公开列名 委托单位：东升镇人民政府 官方边界：缺失 不从项目名称反推研究范围 权属记录：缺失 不落具体建筑、首层或前场 现场任务 / PENDING FIELD ROUTE FS-02 · ≥15 点 × 工作日/周末 2 时窗 禁止推定 研究项目存在不等于方案获批，也不证明边界、权属或法定指标。	大钟寺 HD00-1603-01 / HD00-1603-03A 已核官方记录 39,522.11 m² 两宗地土地面积合计 96,811.51 m² 地上规模上限：FAR ≤ 2.4496 ¥2.8 bn 成交价：竞得人已公开 现场任务 / PENDING FIELD ROUTE FS-03 · ≥16 点 × 早/晚/周末 3 时窗 禁止推定 记录只覆盖两宗地，不能外推至约 72 ha 重点区或邻接道路、站点。
---	---	--

证据准入链

时间戳	▶	定位+精度	▶	方向	▶	公共空间	▶	结构化发现	▶	隐私清理	▶	照片 SHA256	▶	复核人
-----	---	-------	---	----	---	------	---	-------	---	------	---	-----------	---	-----

0 条合格现场观察 · 三条路线均为 PLANNED · 不声称现场性能、实际竣工或共同设计已验证
